

**INFORME SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE SAP GESTIÓ DE
RECURSOS HUMANS**

DOCUMENT INFORMATIU CG 4/11 2011

**Vicerector de Personal Acadèmic
Gerència
Barcelona 9 de novembre de 2011**



Projecte SPA

Implantació de SAP Recursos Humans Informe de situació

Vicerectorat de personal acadèmic
Gerència
Octubre /2011



Mòduls en productiu Juny/2011



- Nòmina
- Comptabilitat (funcionalitat mínimes)
- Administració de Personal
- Organització
- Intranet de personal (funcionalitat mínimes)
- Interfícies
- Formació (funcionalitats mínimes)



Situació dels mòduls en productiu

- Múltiples incidències en:
 - Nòmina
 - Administració de Personal
 - Organització
 - Interfícies
- Més dificultats de les esperades en
 - Comptabilitat
 - Intranet de Personal

Conseqüències dels problemes

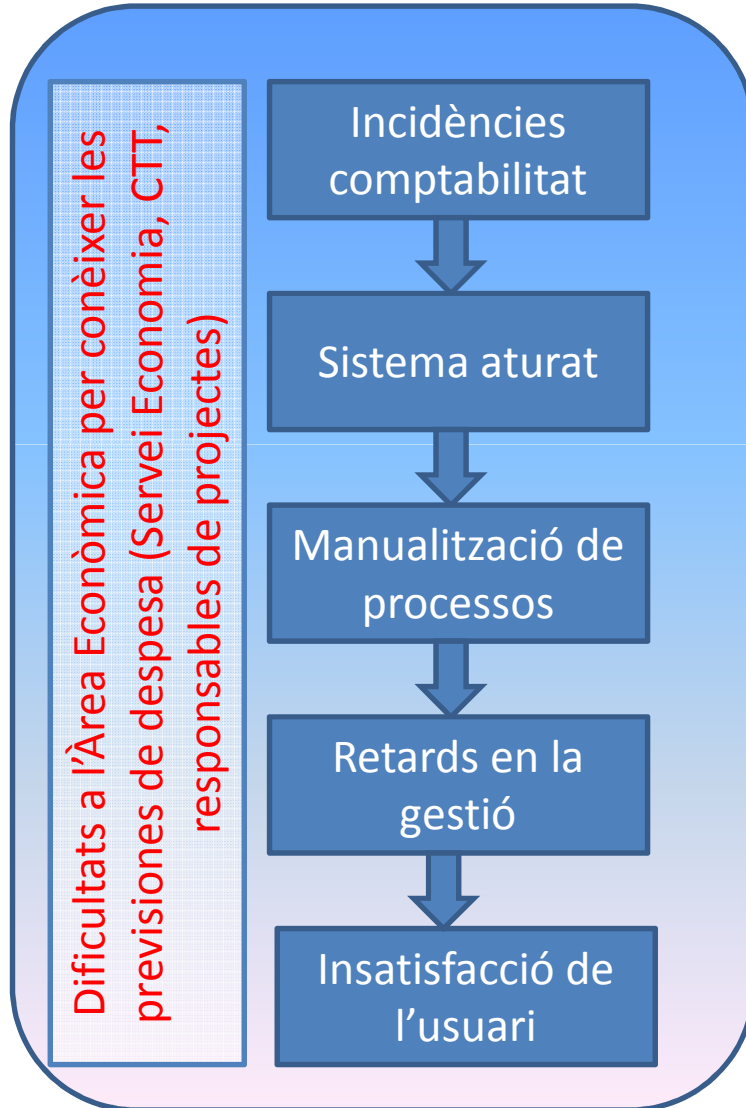



Mesures correctives en estudi

- Replanificació de les següents fases del projecte
- Reforç de les tasques del manteniment



2a fase novembre/2011-gener/2012 (en revisió)

- Formació (II)
- Elaboració pressupost
- Comptabilitat pressupostària
- Intranet de personal
- Interfícies



2a fase novembre/2011-gener/2012 (en revisió)

	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12	Mar-12
Formació	Desenvolupament		Probes	Suport			
Elaboració del Pressupost	Desenvolupament		Probes	Suport			
Comptabilitat Presuposatària (II)				Desenvolupament		Probes	Suport
Portal (II)	Desenvolupament		Probes	Suport			



3a fase març-maig/2012 (en revisió)

- Selecció i provisió
- Gestió de temps
- Demandes judicials
- Pla de pensions
- Gestió de Becas
- Tarifes



3a fase març-maig/2012 (en revisió)

	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12
Selecció i Provisió	Desenvolupament				Probes		Suport			
Gestió de Temps					Desenvolupament			Probes	Suport	
Demandes Judicials					Desenvolupament	Probes	Suport			
Plans de Pensions					Desenvolupament	Probes	Suport			



Projecte SPA

Implantació de SAP Recursos Humans Informe de situació

Vicerectorat de personal acadèmic
Gerència
Octubre /2011
